



**PURITA** | SOLUCIONES INDUSTRIALES

**011-4441-9515**

Monseñor Bufano 4224

www.puritasoluciones.com.ar

672\*4944

**INGENIERIA Y MONTAJES  
PARADAS DE PLANTA  
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  
REPARACION DE BOMBAS Y VÁLVULAS  
CINTAS TRANSPORTADORAS**

**INFORME TECNICO AVANCE MIÉRCOLES 12 - 08 - 15 PARADA DE PLANTA**


CLIENTE: Siderúrgica

FECHA: 12 - 08 - 15

LUGAR: ZONA OESTE

PARADA DE PLANTA

TAREAS	DETALLE
DESMONTAJE	SI
DESARME	SI
LIMPIEZA	SI
CAMBIO POLEAS	SI
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA	SI
SOLDADURA	SI
OTROS	-

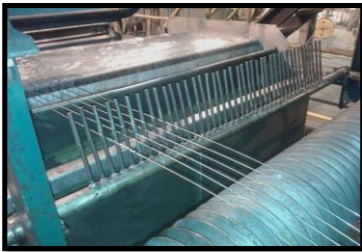

TRABAJO REALIZADO: Reacondicionamiento del peine en la entrada de la pileta de cera, se colocaron los pernos faltantes(provistos por el cliente) y se alineo el conjunto.

TRABAJO REALIZADO: Reacondicionamiento del peine en salida pileta de cera, se colocaron los pernos faltantes (provistos por el cliente) y se alineo el conjunto.

TRABAJO REALIZADO: Reposicionado y adaptación del cortagota a la salida de la pileta de cera, cambio de la ceramica ( provista por el cliente) y regulacion del conjunto.



TRABAJO REALIZADO: Adaptación y construcción de la cañería de vapor para serpentina del flux.

TRABAJO REALIZADO: Desmontaje del soporte de rodillo, peine y bandeja de arenas en la pileta de plomo, nivelación y reacondicionado del mismo.

TRABAJO REALIZADO: Protección de seguridad de la cañería vapor serpentina flux.



TRABAJO REALIZADO: Reposicionado de cañería de vapor para la serpentina del flux, la mejora realizada es elevar la misma para evitar la corrosión por el ataque quimico.

TRABAJO REALIZADO: Cambio de rodamientos nuevos ( provistos por el cliente) en el rodillo pisador sobre la pileta de zinc.

TRABAJO REALIZADO: Cambio de Válvulas de 2" y 3" en bombas de lavado por valvulas nuevas a diafragma provistas por el cliente y construcción de la soportería.



TRABAJO REALIZADO: Montaje del conjunto peine, rodillo y bandeja niveladora y alineadora.



TRABAJO REALIZADO: Bobinadores 9 y 10, con desarme completo de los conjuntos, metalizado completo de ambos platos, cambio de araña, pernos, patas con revisión del embrague reductor.



TRABAJO REALIZADO: Bobinador, trabajo IDEM ANTERIOR



TRABAJO REALIZADO: Construcción de plataformas y pisos de la fosa en horno austenizado, se construyo bastidor desmontable y pisos extraíbles.



TRABAJO REALIZADO:., trabajo ANTERIOR TERMINADO.



TRABAJO REALIZADO: Cambio rodamientos en el rodillo de 200 mm de fosfato, cambio de bujes de teflon en las poleas por bujes nuevos.



TRABAJO REALIZADO: idem anterior pero trabajo terminado.



TRABAJO REALIZADO: Montaje de escaleras para acceso a bandeja de arenas en la pileta de plomo, se adaptaron y modificaron barandas y guardapiés de ingreso a la bandeja.



TRABAJO REALIZADO: idem anterior.



TRABAJO REALIZADO: Revisión y reparación de todas las posiciones en bobinadores, cambio de arañas, pernos, ejes de piston, patas, reparación de embragues, reductores, lubricación.



TRABAJO REALIZADO: Construcción y montaje de deflector para evitar salpicado en la pileta de cera.

FIN
