

INFORME VIERNES Nº 2 DE AVANCE DE OBRA

FECHA: VIERNES 09 / 01 / 15.

OBRA: PARADA DE PLANTA – TREFILADORA OTT 670

JEFE DE OBRA: SR. DIEGO TREJO

JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: LIC. GABRIEL AMOROSO

RESPONSABLE TECNICO COMERCIAL: SRTA. CAROLINA CALANDRIA.

CUMPLIMIENTOS DE NORMA ISO Y DE SEGURIDAD DE FPSI Y CLIENTE:

1. Se cumplieron las normas de seguridad de ambas empresas a cargo de nuestro jefe de obra y jefe de seguridad.

AVANCE DE OBRA

1. FECHA 03/ 01 / 14 SABADO. 6 A 14 HS. Se desmontan 3 pistones de la base del tees. Se cambian retenes sin fin pasada Nº 8. Se desarman 13 poleas de pasadas trefiladora. Se desarma el tablero de la bobinadora.
2. FECHA 05/ 01 / 14 LUNES. 6 A 18 HS . Se desmonta eje sin fin de la pasada 3 y 5. Se desmontan brazo encarrilador 4,5 y 6. Se saca para embujar brazos de abano de los encarriladores. Se lavan cadenas de sensores.
3. FECHA 06/01 / 14. MARTES. 6 A 18 HS Se arman pasadas 1, 2 4, 6,7 y 8. Se cargan carter 1, 2 , 4, 6 y 8 con aceite OMALA 320 (SHELL). Se desmontan rodamientos 6216 en poleas. También se ponen tacos de tope en trefiladora. Por último se saca la olla de pasada 1 y 8.

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA - INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.

4. FECHA 07/ 12 / 14 MIERCOLES. 6 A 18 HS se pasa cable SINTENAX, 16 x 4 desde tablero hasta motor bombina. Se montan motores y ventiladores de trefiladora. Se desclava corona de pasada N° 5. Se carga carter N° 7 con aceite. Se monta pasada N° 7.
5. FECHA 08/ 01 / 15 JUEVES. 6 a 18 hs Se desclava corona de pasada N° 5. Se carga carter N° 7 con aceite. Se monta pasada N° 7. Se desclava pasada N° 7.
6. FECHA 09/ 01 / 15 VIERNES. 6 A 18 HS se monta corona N° 5. Y se arma tablero neumático, válvulas y pistones de trefiladora.


RECURSOS NECESARIOS PARA AVANCES PROXIMA SEMANA (MATERIALES – EQUIPOS – TERCEROS – ETC)

1. Se entrega el material (pedido de urgencia) 60 litros de ELECTROSOLV para poder avanzar con el trabajo el día jueves 08 – 01 – 15. Se facturara el día lunes en base a los remitos de la orden de compra abierta que tenemos.
2. Se entregó la documentación que faltaba, a la espera de que nos confirmen que día puede empezar el técnico.
3. Se agregara aire acondicionado en el obrador, para cuidado de nuestro personal el día sábado 10/ 01 / 15.
4. El día martes se llevara al obrador, mesa de trabajo, morsa, piedra, estanterías, y taquilla. Quedando de este modo completo para realizar una gran variedad de trabajos que vayan surgiendo en planta. También se agregaran herramientas según los trabajos que se vaya pidiendo que PURITA SRL lo solucione.

SE ADJUNTAN FOTOS DE LA OTT 670 EN PROCESO DE MANTENIMIENTO Y DEL LIBRO DE OBRA FIRMADO POR EL SUPERVISOR Y LA RESPONSABLE COMERCIAL.

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA - INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.

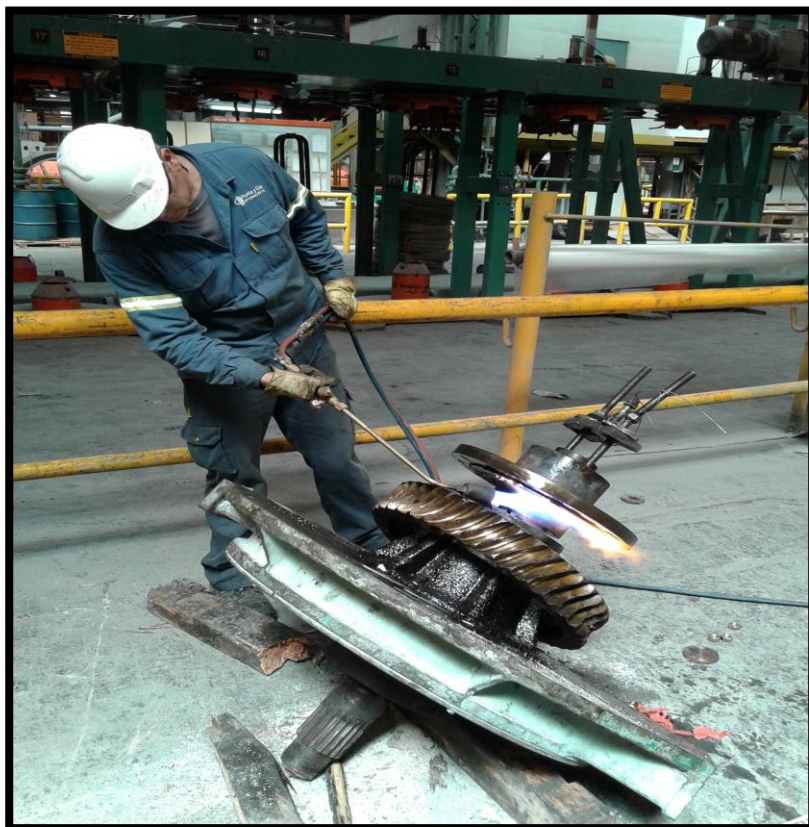

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACION DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACION Y
LUBRICACION - REPARACION DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.



MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACION DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACION Y
LUBRICACION - REPARACION DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.



MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACION DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACION Y
LUBRICACION - REPARACION DE BOMBAS - VALVULAS Y CILINDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRACION CORROSION Y ATAQUES QUIMICOS - REPARACION MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.



MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y
LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.
